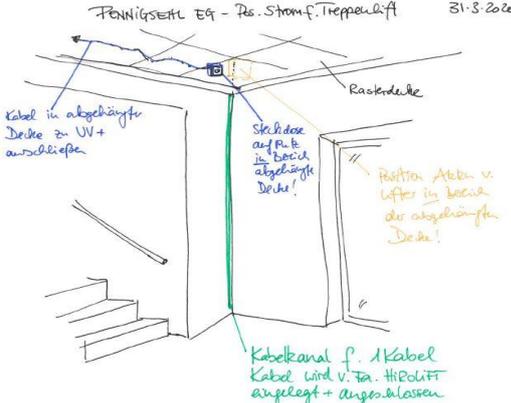


GS Mainsche Protokoll Baustelle KW14  
 Umnutzung OG und EG Wegefunder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	31.03.2020
Dauer :	9:30-10:30h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Frau Schwarzien, Herr Tappe Hausmeister: Firmen: Herr Meyer (Fa. Gmeyer), Herr Engelmann, Herr Schäfer (HiroLift)
-------------	---

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. <b>Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!!</b> Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
	<i>Covid19: Die Baustelle ist nach Abwägung der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes grundsätzlich weiter zu betreiben. Auf der Baustelle sind die Gefahren der Ansteckung mit dem Corona Virus und seiner Verbreitung zu minimieren. Hierzu ist insbesondere die Gleichzeitigkeit von Arbeiten auf engem Raum zu vermeiden. Es gilt Abstand zu halten und die persönlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten, zur Orientierung dienen etwa die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Die Schultoiletten dürfen genutzt werden. Hier stehen Wasser, Seife und Handtücher zur Verfügung.</i>		
1 d	EG: Betreuungsraum - Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Drei Akustikdeckenfelder werden noch eingesetzt sobald geliefert.  Der Raum darf eingerichtet und genutzt wrden. Auf Filzgleiter ist zu achten! Die vorhandenen schwarzen Stühle hinterlassen Spuren auf dem neuen Boden!	Engelmann  Wegefunder	
2 f	Trockenbau, OG: Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen Leibungsverkleidung Fenster kann montiert werden  Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind hergestellt	Brüggemann	ab sofort

3 e	<p>Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Endmontagen und Liferanschluss hergestellt Liferanschluss:</p> 	lbk/ Gerald Lange	
6 c	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden	Brüggemann	ab sofort
8 d	Wandbereich mit schwarzen Belag ist zu verputzen	Seebode	ab sofort!!!
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten.	Engelmann	bitte Info wenn geliefert
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	
13 f	Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange ausgeführt. Betreuungsraum EG ist die Steckdose und Netzwerkstecker montiert	Gerald Lange	
15	Glocke/Turmuhren sind wieder in Betrieb zunehmen	Gerald Lange	bitte Rückmeldung
17 c	Es sind noch 2 Putzarbeiten zu erledigen: Wand im Abstellraum rechts und schwarze Wand Giebel, siehe Mail v. 18.03.2020	Seebode	
18 a	Im EG Betreuungsraum wurden dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Da sich die Anzahl der Leuchten reduziert hat müssen noch 3 Akustikplatten ergänzt werden.	Engelmann	wenn geliefert
20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	Kann sofort-bitte Info wenn erfolgt!
22	Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.	Tubbesing/ Wittmershaus	
23	Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht gegen die Heizleitungen schlägt!	Tubbesing	

<b>24 b</b>	<p><b>ZEITSCHIENE gem. Abstimmung:</b>  <b>Datenverkabelung: KW 10 erledigt</b>  <b>Putzarbeiten Seebode: KW 11 erledigt</b>  <b>Trockenbau WC schließen, spachteln: KW 11 erledigt</b>  <b>Malerarbeiten KW 12-15</b>  <b>Bodenbelag: KW (15) 16-17 (!) Achtung ab hier Änderung</b>  <b>Türen: KW 17</b>  <b>Endmontagen: KW 17-18</b></p> <p><b>Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!</b></p>	ALLE GEWERKE	
<b>25 a</b>	<p>Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe/Produkt: Forbo Marmoleum Fresco, Farbton Sage (Salbei), Farbe 3891  Zusätzlich Wandbereich farbig - Wand rechts und fensterseitig  Farbton: STO 36332</p>		
<b>26 c</b>	<p>Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser angefragt, Abstimmung und Ausführung in Arbeit</p>	lbk	
<b>27 a</b>	<p>Küche: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden  WC: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden</p>	Seebode	sofort
<b>31 a</b>	<p>Der Treppenlift ist beauftragt. Farben wurden abgestimmt:  Gehäuse Aluminiumgrau  Lehnen und Sitzschale: schwarz  Polsterbezug: Kunstleder (strapazierfähig auch für den Außenbereich geeignet): mittelgrau  mit Fernbedienung und Schlüsselschalter  Lieferzeit: 6 Wochen ab heute</p>	HiroLift	
<b>32</b>	<p>Stahlzargen im OG (3 Stück) sowie Handlauf Treppe im Farbton RAL 7039 (Quarzgrau) lackieren</p>	GM Meyer	Info
<b>33</b>	<p>Bodenbelag auf der linken Seite kann (sofern Kapazitäten frei sind) ab Montag 06.04. gelegt werden, dann ist der Maler auf dieser Seite fertig</p>	Tubbesing	
<b>34</b>	<p>Im langen Abstellraum neben dem Multifunktionsraum muss die Schräge wieder tapeziert werden. Die alte Tapete lässt sich nicht vollständig lösen, die GK Platte wird bei weiterem Abkratzen zu stark beschädigt. Tapete Rauhfaser fein + Anstrich.</p>	GM Meyer	
<b>35</b>	<p>Schiebetür Küche: Wand hat im Bereich der linken Leibung starken Knick, daher ist das vorgesehene Schiebeelement nicht praktikabel, Engelmann arbeitet eine Alternative aus. Ausführung mit Slim-Beschlag. Türblattmaß muss ggf. angepasst werden, je nach Beschlag. Engelmann macht angepasstes Angebot.</p>	Engelmann	
<b>36</b>	<p>Tür Küche zu Gemeindearchiv: Ecken Zarge sauber anputzen (mit Schiene), Holz bleibt sichtbar!</p>	Seebode	sofort

37	Flurtüren werden geliefert Ende der Woche. Einbau und Überarbeiten Beständtüren in Absprache mit Maler	Engelmann	
38	Endmontage Elektro inkl. Leuchten: ab Dienstag, 14.04.2020	Lange Info alle Gewerke	
39	Dachboden wurde begangen, Oberseitige Lage Rauhspund wird durch Fa. Engelmann ausgeführt um feuerhemmende Qualität der Decke sicherzustellen. In Teilbereichen muss Unterkonstruktion ergänzt werden.	Engelmann	
<p>Nächster Termin:  <b>07.04.2020</b>  Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.</p>			
